CRONOPROGRAMMA INTEGRATO

ATTIVITA'	Riferimento all'Accordo	durata
Sottoscrizione ed Efficacia Accordo tra le Parti	Art.10	-
Opere lettera a) art.3: Progetto Preliminare	Art.3bis	2 MESI
Opere lettera a) art.3: Confronto Pubblico	Art.3bis	4 MESI
Opere lettera a) art.3: Progetto Definitivo e SIA	Art.4	5 MESI
Opere lettera b) art.3: Progetto Definitivo	Art.4	5 MESI
Avvio iter approvativo: Valutazione Tecnica Preventiva MIT	Art.5	1 MESI
Sottoscrizione ed efficacia del verbale ai fini dell'inserimento degli interventi in Convenzione Unica e decreto MIT (ASPI-MIT)	Art.6	-
Opere lettera a) art.3: Iter approvativo - VIA e localizzazione urbanistica	Art.5	7 MESI
Opere lettera b) art.3: Iter approvativo	Art.5	7 MESI
Opere lettera a) art.3: Provvedimento di Intesa Stato Regione	Art.5	-
Opere lettera b) art.3: Provvedimento approvativo	Art.5	-
Verifica MIT/ASPI dei presupposti dell'iniziativa	Art. 7	1 MESE
Comunicazione alle Parti dell'esito dell'iniziativa (MIT/ASPI)	Art. 7	-
Opere lettera a) art.3: Adeguamento Progetto Definitivo e sviluppo Progetto Esecutivo	Art. 7	2 MESI
Opere lettera b) art.3: Adeguamento Progetto Definitivo	Art. 7	2 MESI
Approvazione MIT progetti definitivi e Pubblica Utilità - approvazione progetto esecutivo delle opere in asse	Art. 7	3 MESI
Opere lettera a) art.3: affidamento lavori e fase esecutiva	Art. 8	42 MESI
Opere lettera b) art.3: Redazione progetto esecutivo (ASPI)	Art. 8	4 MESI
Opere lettera b) art.3: Approvazione progetto esecutivo (MIT)	Art. 8	3 MESI
Opere lettera b) art.3: Procedura di affidamento opere sul territorio	Art. 8	6 MESI
Opere lettera b) art.3: lavori	Art. 8	29 MESI

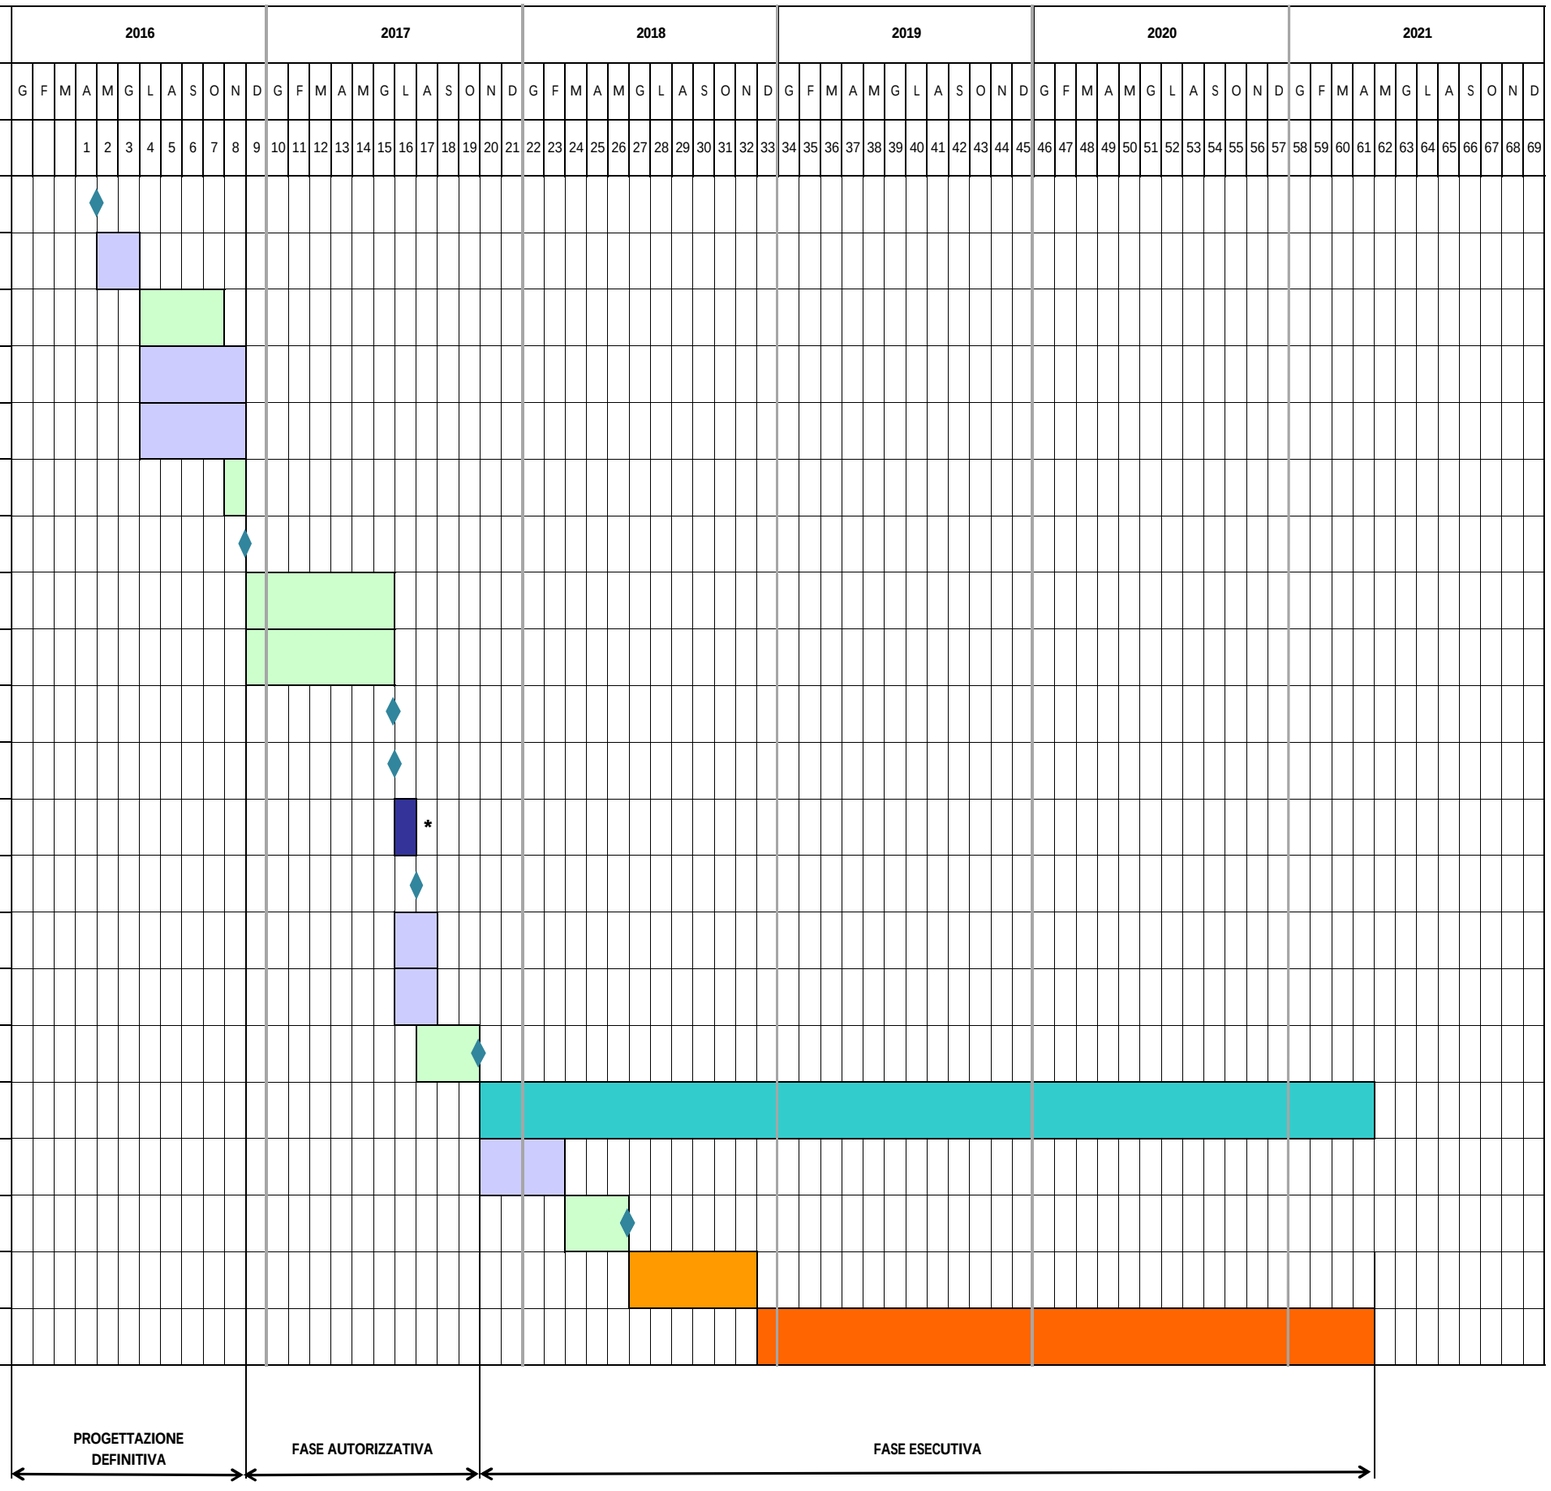

* Il termine per la verifica dei presupposti dell'iniziativa decorre dalla conclusione degli iter autorizzativi di entrambi i progetti.
